



Informe de Terminación

PROYECTO: Sistema de Agua Segura en Pallcapampa



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Sistema de Agua Segura en Pallcapampa

Institución solicitante

Sindicato Agrario de la Comunidad de
Pallcapampa

Responsable

Feliciano Quispe (Comité de proyecto)

Roberto Choque (Comité de proyecto)

Pedro Choque (Comité de proyecto)

Sandra Laura (QBL-BO)



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Larecaja


Municipio: Sorata

Comunidad: Pallcapampa

Tiempo de viaje: 5 horas

Distancia: 175 Kms.

Beneficiarios: 17 Familias

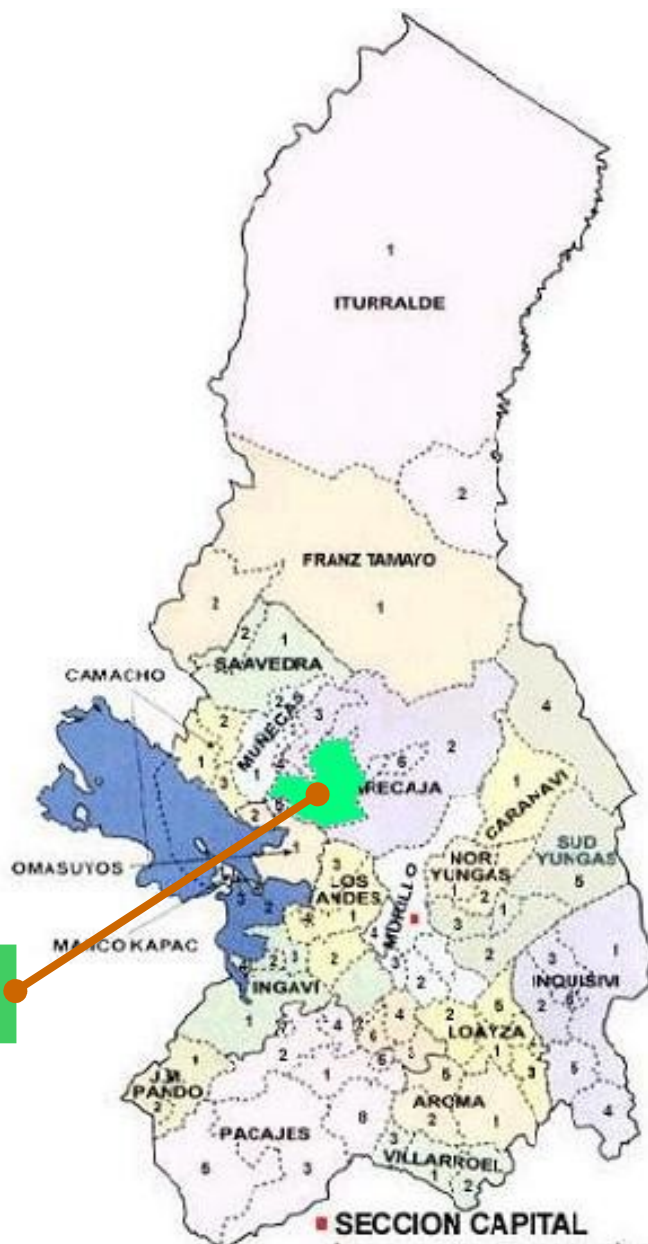

Sorata

TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: 31, Octubre de 2007

Fecha de finalización: Enero de 2008

Aporte QBL: \$us 6152,62
Aporte local: \$us 750,00

Costo Total: \$us 6902,62



RESULTADOS



RESULTADO 1

Planificado

Asistencia del 100% de las familias beneficiarias (mínimo 1 miembro / familia), a los talleres informativos.

Al año de ejecutado el proyecto el 80% de las familias muestra cambios en hábitos de higiene y buen uso del agua.

Logrado

El 80 % de las familias beneficiarias ha asistido a los talleres informativos.

El levantamiento de datos en hábitos de higiene y buen uso de agua, fue realizado adecuadamente durante la implementación del proyecto.

RESULTADO 2



Planificado

En el lapso de 2,5 meses, se construirá los siguientes componentes del sistema de agua potable:

- Tanque de almacenamiento
- Tendido red principal
- Distribución Domiciliaria

Logrado

Se tiene establecido los siguientes componentes del sistema de agua:

- 1 tanque de almacenamiento de 10m³.
- Tendido de red principal.
- 6 Cámaras Rompe presión
- Distribuciones domiciliarias.
- 17 piletas

A la finalización del proyecto

RESULTADO 3



Planificado

Capacitación a 17 familias en manejo y operación de sistemas de agua potable.

Logrado

Desarrollo de eventos de capacitación en manejo y operación del sistema contando con un 80% de participación de los beneficiarias.



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Al año de implementado el proyecto se espera una disminución del 30% en casos de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) en menores de 5 años.

Logrado

El logro de este resultado será verificable, como menciona el indicador un año después de culminada la implementación del sistema.

PROPOSITO

Planificado

A los cuatro meses de iniciado el proyecto 17 familias tendrán acceso directo a agua apta para consumo y contarán con la información necesaria para un buen uso del elemento.

Logrado

A los 2 meses de iniciado el proyecto, se implemento 17 piletas construidas, con acceso a agua apta para consumo humano.

IMPACTOS

ECONOMICO

El acceso directo a agua, ha reducido el tiempo de recolección de agua, que puede usarse en actividades agropecuaria y mejoren la economía familiar.



IMPACTOS

SOCIAL

La instalación del sistema consolidará el establecimiento de nuevas familias y mejorará las condiciones de vida de las ya existentes.



IMPACTOS

TECNOLOGIC



El sistema de agua instalado posee tecnología apropiada y de fácil manejo.





COMENTARIOS ADICIONALES

Se ha contado con una excelente participación por parte del comité, ya que estos siempre estuvieron presentes durante la compra y entrega de materiales, así como en el desarrollo de todo el accionar del proyecto.

Las familias cumplieron las actividades planificadas, así como con plazos de entrega.

Al contar las familias beneficiarias con acceso agua, se espera que ahora si funcione las letrinas anteriormente implementadas. Ya que esta era de las justificaciones del funcionamiento de las letrinas.
