

Informe de Terminación



**PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
VIVIENDA PARA
MEDICOS EN LA COMUNIDAD DE
AMACARI**



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Título del Proyecto

Construcción de vivienda para médicos en la
Comunidad de Amacari

Institución solicitante

Comité del Centro de Salud de Amacari

Responsable

David Ramírez C.

Carla Morales A.



LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento: La Paz

Provincia: Manco Kapac


Municipio: Tiquina

Comunidad: Amacari

Tiempo de viaje: 3 horas

Distancia: 110 Kms.

Beneficiarios: 6093 habitantes

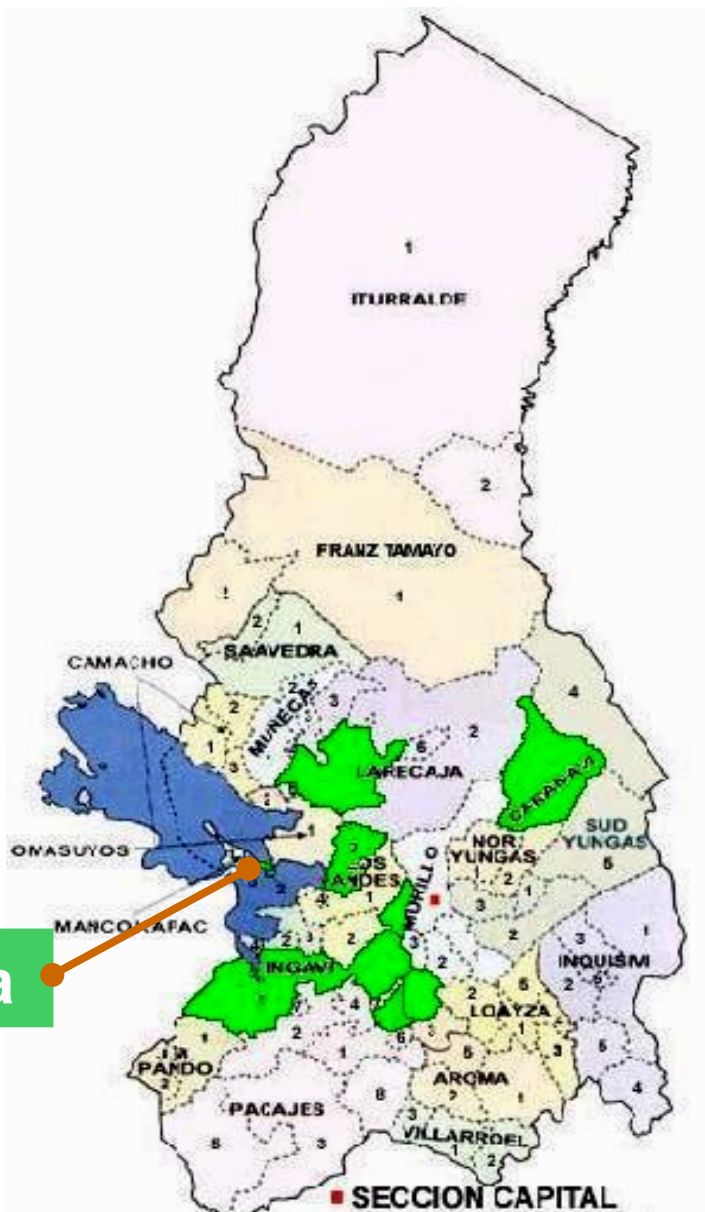

Tiquina

TIEMPO DE EJECUCION Y COSTO

Fecha de inicio: Enero 2004

Fecha de finalización: Junio 2004

Aporte QBL: \$us 24990.00

Aporte local: \$us 0.00

Costo Total: \$us 24990.00



RESULTADOS



Planificado

Al 3er mes, estarán
construidos 4
dormitorios, 4 baños, 1
biblioteca, 1 cocina
comedor, 1 deposito y 1
salón múltiple.

Logrado

Al 5to mes, se ha construido 5 dormitorios, 3
baños sin artefactos, 1 biblioteca, 1 cocina
comedor, 1 depósito y 1 salón múltiple.



RESULTADOS



Planificado

Al 3er mes, se contará con un estanque de agua potable de 12000 litros.

Logrado

Al 5to mes, se cuenta con un estanque de agua potable de 9000 litros.



OBJETIVO Y META

FIN

Planificado

Hasta finales del 06, se habrá aumentado en un 50% el acceso a la atención en salud, del Municipio de Tiquina.

Logrado

Se aumentó el acceso a la atención en Salud del Municipio de Tiquina.

Los servicios de medicina general entre sep 03 a abr 04, es de un promedio mensual de 95 pacientes.

La atención odontológica en el mismo periodo da un promedio mensual de 41 pacientes .



OBJETIVO Y META



PROPOSITO

Planificado

A los 90 días de iniciado el proyecto, se contará con personal médico (4) para la atención en salud.

Logrado

El centro médico, cuenta con el siguiente personal en salud permanente.

1. Enfermero – Ricardo Urruchi
2. Médico – Rogelio Chambilla (personal municipio)

A estas personas, se suma personal a tiempo parcial:

3. Odontóloga – Briseida Loma.
4. Médico – Miguel Silva.

Que son respaldadas con estudiantes de enfermería.

IMPACTOS

ECONOMICO

Menos gasto de recursos en traslado a otros centros fuera del área.



IMPACTOS

SOCIAL

Se mejora el acceso a los servicios de salud.

Las visitas domiciliarias, permiten una atención personalizada y remisión de casos complicados.



IMPACTOS

TECNOLOGIC



Dotación de equipos e insumos médicos con tecnología actual.



IMPACTOS

ECOLÓGICO

El proyecto está apoyando en la salud ambiental del municipio.



COMENTARIOS ADICIONALES



- Las viviendas del Centro Médico Boliviano Irlandés de Amacari, ha permitido generar condiciones adecuadas para ejercer su trabajo, al personal médico y administrativo del Centro de Salud.
- El Comité de Salud del Cantón Amacari, esta trabajando en el apoyo para la gestión de recursos con la HAM de Tiquina.
- Los problemas económicos del municipio y el cambio de las autoridades municipales, debido a los problemas internos, hacen muy poco viable la coordinación.
